

沖縄モノレール工事 市道国際センター線都市モノレール建設工事


鋼軌道桁建設施工台帳



施工業者： ダイキ工業株式会社

市道国際センター線都市モノレール建設工事(鋼軌道桁建設施工)

ダイキ工業㈱

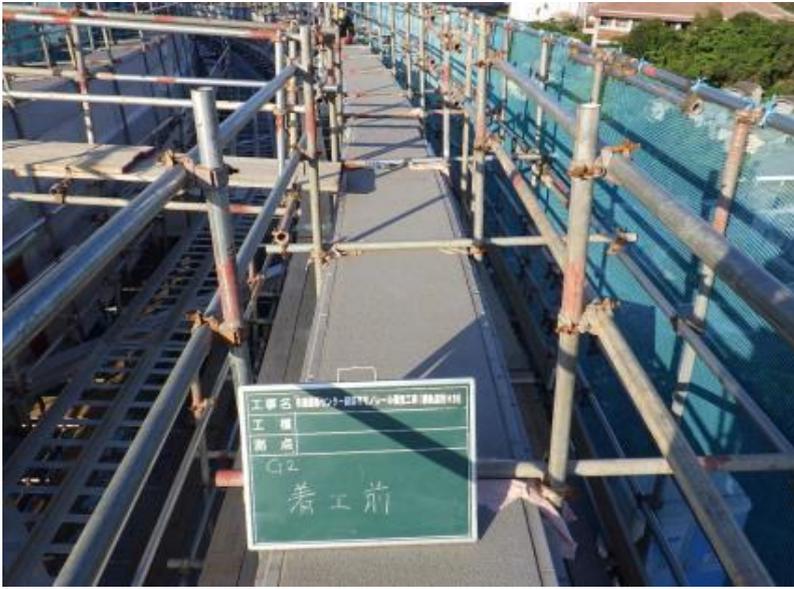	通し番号	1
	備考	
P676～P680 着工前		
	通し番号	2
	備考	
P676～P680 着工前		
	通し番号	3
	備考	
P676～P680 着工前		

市道国際センター線都市モノレール建設工事(鋼軌道桁建設施工)

ダイキ工業(株)

	通し番号	4
	備考	
	P676～P680 完了	
	通し番号	5
	備考	
	P676～P680 完了	
	通し番号	6
	備考	
	P676～P680 完了	

市道国際センター線都市モノレール建設工事(鋼軌道桁建設施工)

ダイキ工業㈱

	通し番号	7
	備考	
P676～P680 G1-J15 着工前		
	通し番号	8
	備考	
P676～P680 G1-J15 養生 状況		
	通し番号	9
	備考	
P676～P680 G1-J15 養生 完了		

市道国際センター線都市モノレール建設工事(鋼軌道桁建設施工)


ダイキ工業(株)



通し番号	10
備考	
P676～P680 G1-J15 ジョイント部 シール 完了	



通し番号	11
備考	
P676～P680 G1-J15 背面バック材取付 状況	

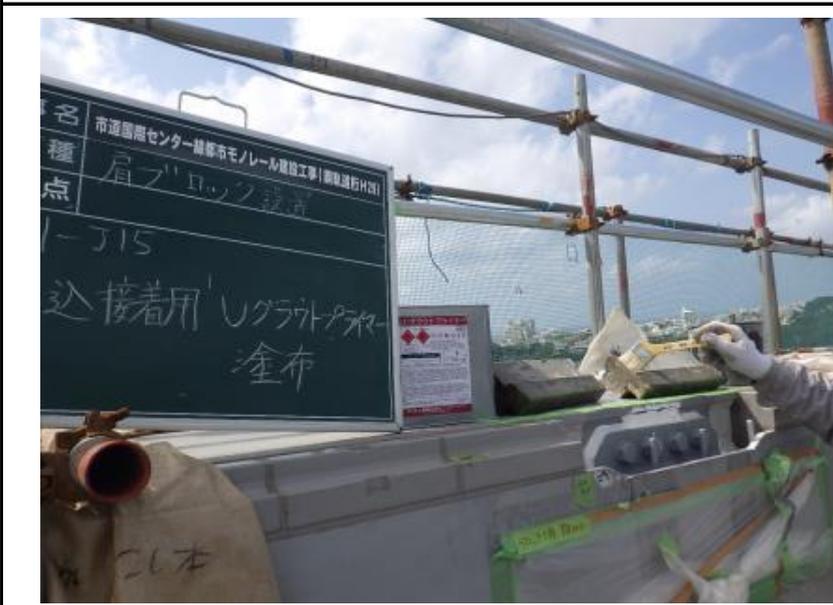

通し番号	12
備考	
P676～P680 G1-J15 Uグラウトプライマー塗布 状況	

市道国際センター線都市モノレール建設工事(鋼軌道桁建設施工)

ダイキ工業㈱



通し番号	13
備考	
P676～P680 G1-J15 Uグラウトプライマー塗布 完了	




通し番号	14
備考	
P676～P680 G1-J15 JB-18充填 状況	



通し番号	15
備考	
P676～P680 G1-J15 JB-18充填 状況	

市道国際センター線都市モノレール建設工事(鋼軌道桁建設施工)

ダイキ工業(株)

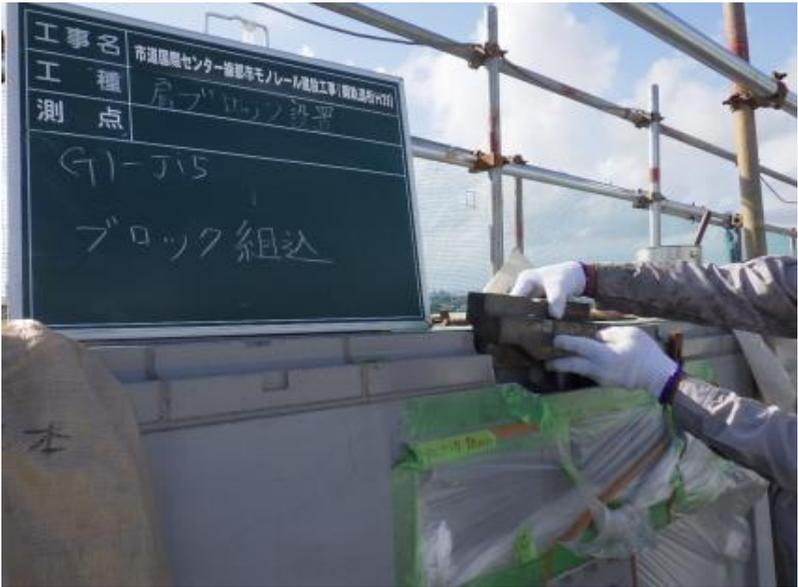	通し番号	16
	備 考	
	P676～P680 G1-J15 ブロック組込 状況	
	通し番号	17
	備 考	
	P676～P680 G1-J15 ブロックライナー調整 状況	
	通し番号	18
	備 考	
	P676～P680 G1-J15 ブロック組込 完了	

市道国際センター線都市モノレール建設工事(鋼軌道桁建設施工)

ダイキ工業㈱



通し番号 19

備考


P676~P680
G1-J15
目地幅測定
5mm



通し番号 20

備考

P676~P680
G1-J15
目地幅測定
5mm

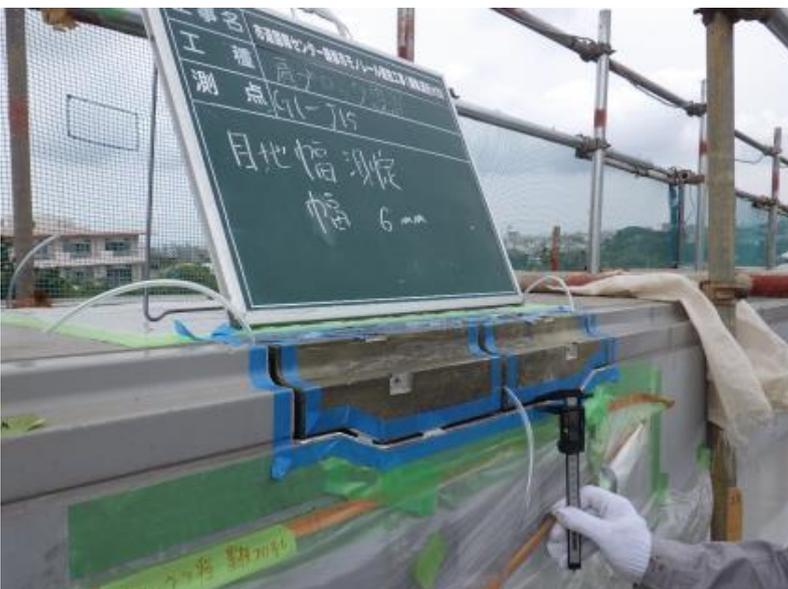

通し番号 21

備考

P676~P680
G1-J15
目地幅測定
6mm

市道国際センター線都市モノレール建設工事(鋼軌道桁建設施工)


ダイキ工業(株)



通し番号 22

備考

P676～P680
G1-J15
目地幅測定
6mm

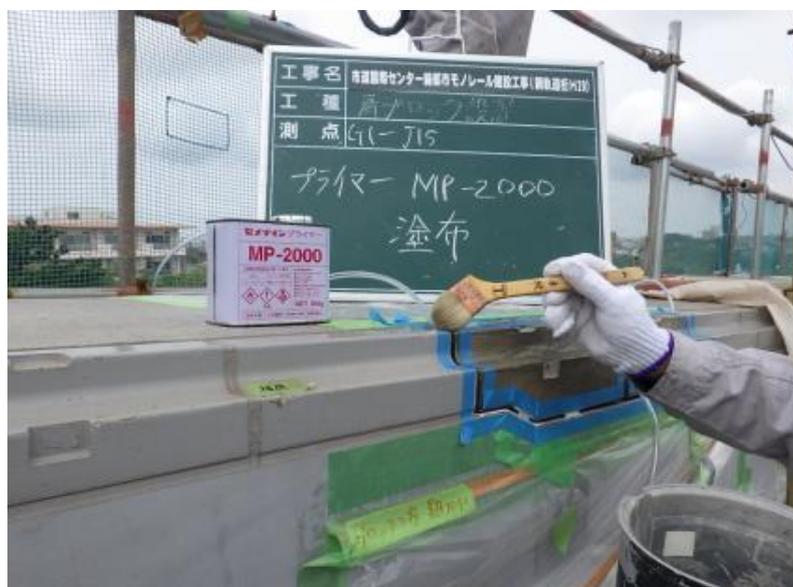

通し番号 23

備考

P676～P680
G1-J15
MP-2000塗布
状況



通し番号 24

備考

P676～P680
G1-J15
ハイSPANコークL充填
状況

市道国際センター線都市モノレール建設工事(鋼軌道桁建設施工)


ダイキ工業㈱



通し番号 25

備考

P676～P680
G1-J15
ハイSPANコークL
ヘラ押さえ
状況

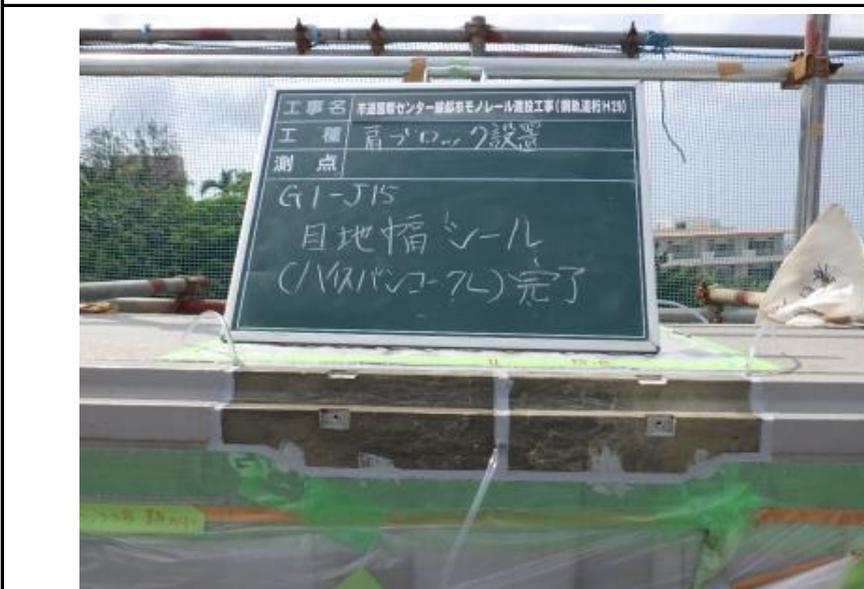

通し番号 26

備考

P676～P680
G1-J15
ハイSPANコークL
完了



通し番号 27

備考

P676～P680
G1-J15
Uグラウト注入
状況

市道国際センター線都市モノレール建設工事(鋼軌道桁建設施工)

ダイキ工業(株)



通し番号	28
備考	
P676～P680 G1-J15 Uグラウト注入 状況	




通し番号	29
備考	
P676～P680 G1-J15 Uグラウト注入 完了	



通し番号	30
備考	
P676～P680 G1-J15 Uグラウト注入 完了	

市道国際センター線都市モノレール建設工事(鋼軌道桁建設施工)

ダイキ工業㈱

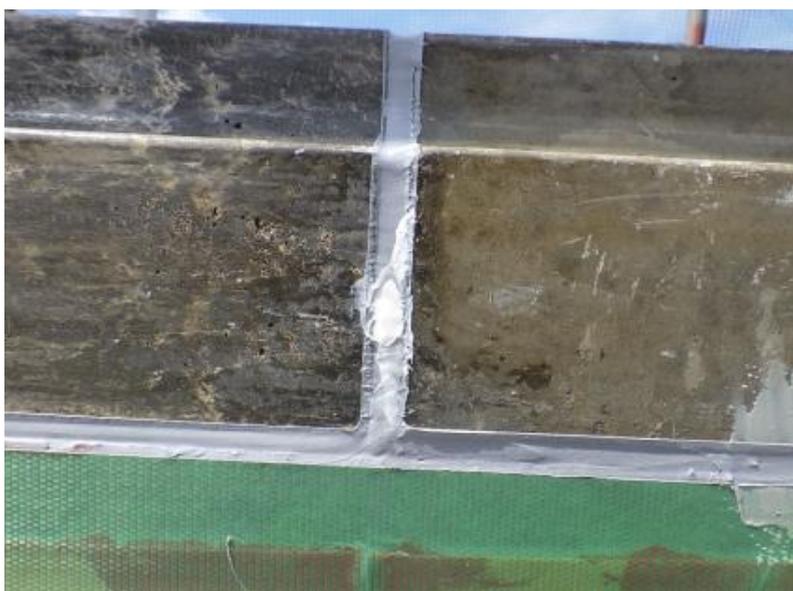

通し番号 31

備考

P676～P680
G1-J15
注入口シール埋め
完了



通し番号 32

備考

P676～P680
G1-J15
SRプライマー塗布
状況



通し番号 33

備考

P676～P680
G1-J15
SRプライマー塗布
完了

市道国際センター線都市モノレール建設工事(鋼軌道桁建設施工)

ダイキ工業(株)

	通し番号	34
	備考	
	P676~P680 G1-J15 SRトップF塗布 状況	
	通し番号	35
	備考	
	P676~P680 G1-J15 SRトップF塗布 完了	
	通し番号	36
	備考	
	P676~P680 G1-J15 出来形測定 ① 1.9 mm 4.4 mm ② 1.8 mm 4.1 mm	

市道国際センター線都市モノレール建設工事(鋼軌道桁建設施工)

ダイキ工業㈱



通し番号 37

備考

P676~P680

G1-J15

出来形測定

- ① 1.9 mm
4.4 mm
- ② 1.8 mm
4.1 mm



通し番号 38


備考

P676~P680

G1-J15

出来形測定

- ① 1.9 mm
4.4 mm
- ② 1.8 mm
4.1 mm

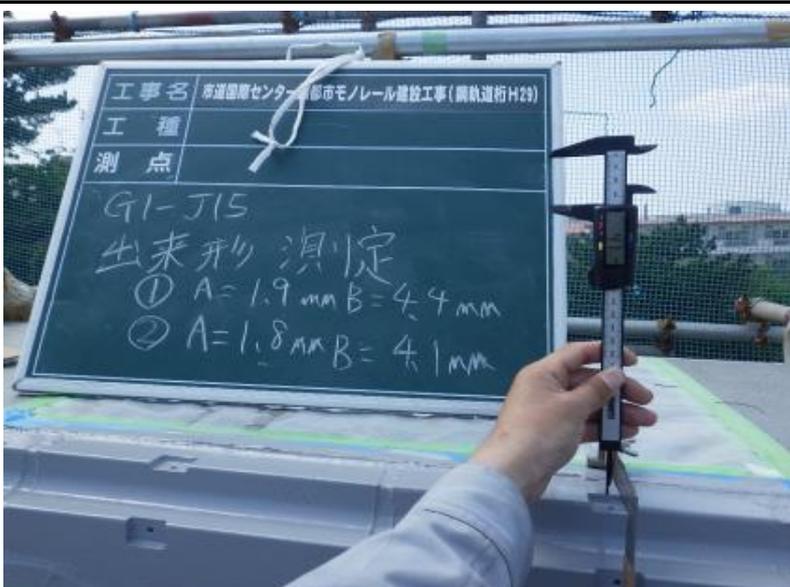

通し番号 39

備考

P676~P680

G1-J15

出来形測定

- ① 1.9 mm
4.4 mm
- ② 1.8 mm
4.1 mm

市道国際センター線都市モノレール建設工事(鋼軌道桁建設施工)

ダイキ工業(株)



通し番号 40

備考

P676~P680

G1-J15

出来形測定

- ① 1.9 mm
4.4 mm
- ② 1.8 mm
4.1 mm



通し番号 41

備考

P676~P680

G1-J15

出来形測定

- ① 1.9 mm
4.4 mm
- ② 1.8 mm
4.1 mm



通し番号 42

備考

P676~P680

G1-J15


完了

市道国際センター線都市モノレール建設工事(鋼軌道桁建設施工)


ダイキ工業株



通し番号	43
備 考	
P676～P680 G2-J1 着工前	

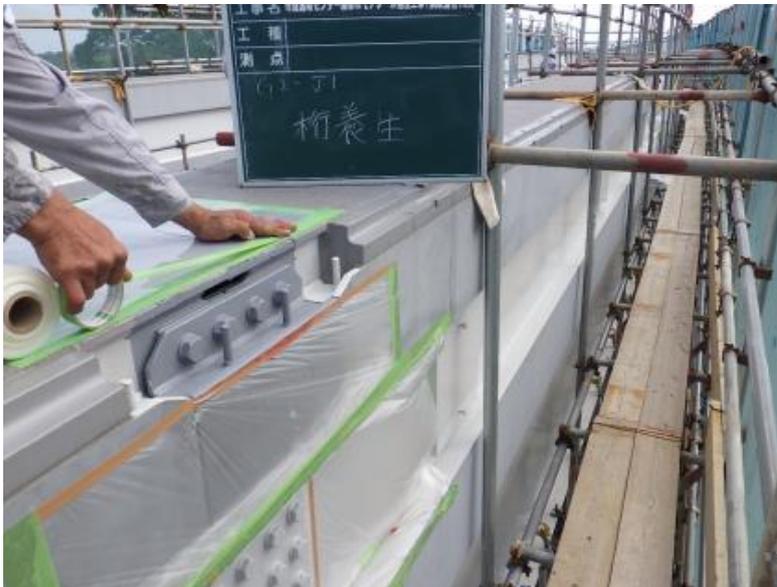

通し番号	44
備 考	
P676～P680 G2-J1 養生 状況	

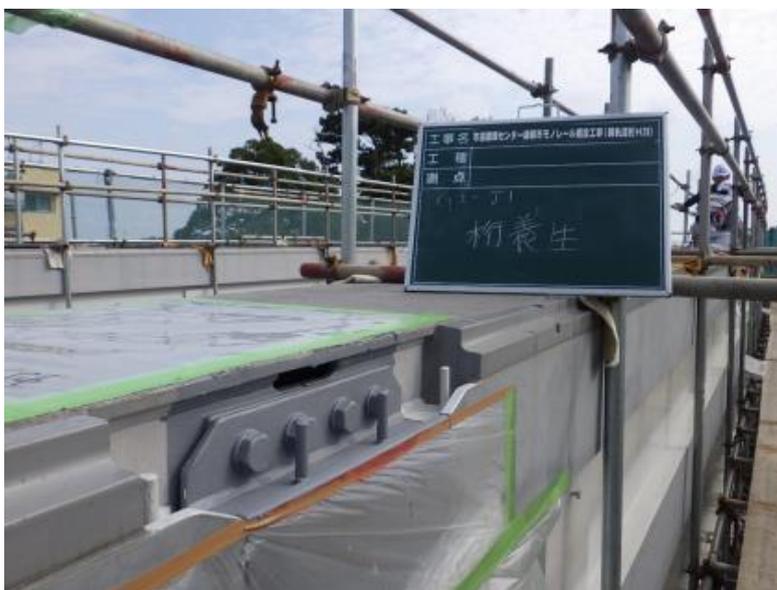

通し番号	45
備 考	
P676～P680 G2-J5 養生 完了	

市道国際センター線都市モノレール建設工事(鋼軌道桁建設施工)

ダイキ工業(株)



通し番号	46
備考	
P676～P680 G2-J1 ジョイント部 シール 完了	




通し番号	47
備考	
P676～P680 G2-J1 背面バック材取付 状況	



通し番号	48
備考	
P676～P680 G2-J1 Uグラウトプライマー塗布 状況	

市道国際センター線都市モノレール建設工事(鋼軌道桁建設施工)

ダイキ工業株

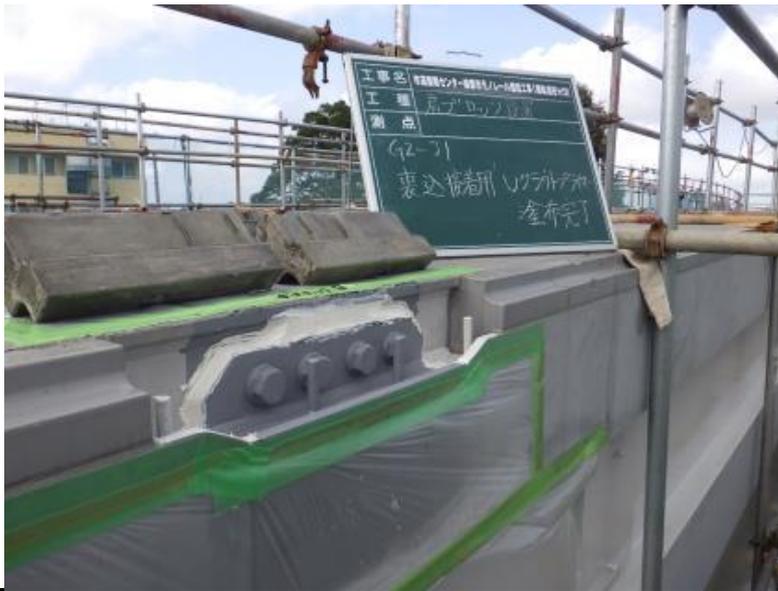

通し番号	49
備 考	
P676～P680 G2-J1 Uグラウトプライマー塗布 完了	



通し番号	50
備 考	
P676～P680 G2-J1 JB-18充填 状況	



通し番号	51
備 考	
P676～P680 G2-J1 ブロック組込 状況	

市道国際センター線都市モノレール建設工事(鋼軌道桁建設施工)


ダイキ工業(株)



通し番号 52

備考

P676～P680
G2-J1
ブロックライナー調整
状況

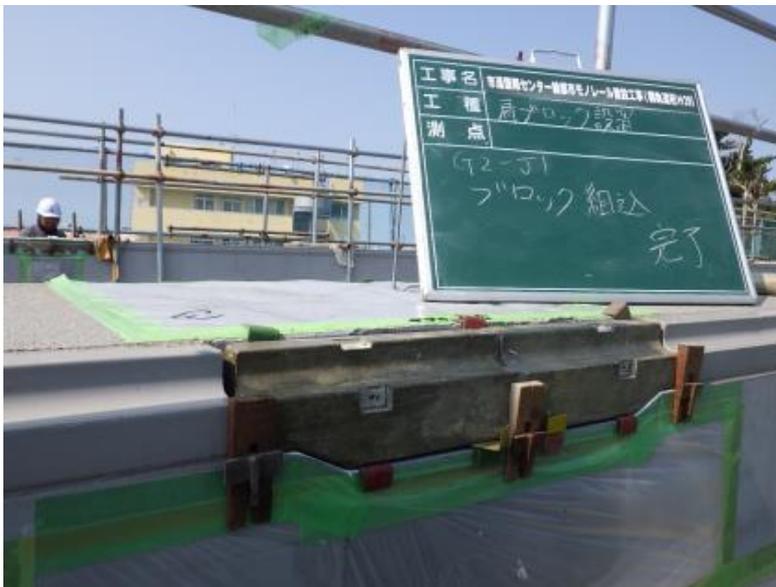

通し番号 53

備考

P676～P680
G2-J1
ブロック組込
完了




通し番号 54

備考

P676～P680
G2-J1
ブロック組込
完了

市道国際センター線都市モノレール建設工事(鋼軌道桁建設施工)

ダイキ工業株

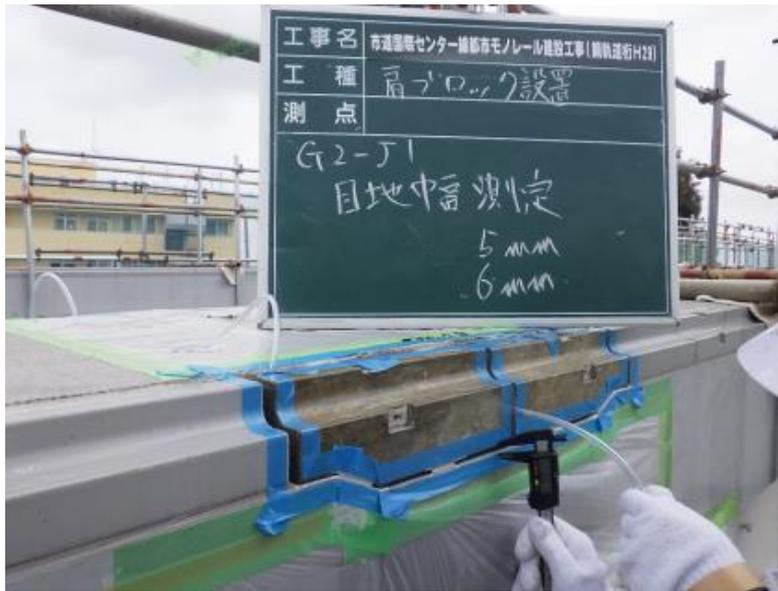

通し番号	55
備考	
P676~P680 G2-J1 目地幅測定 5mm	




通し番号	56
備考	
P676~P680 G2-J1 目地幅測定 5mm	




通し番号	57
備考	
P676~P680 G2-J1 目地幅測定 6mm	

市道国際センター線都市モノレール建設工事(鋼軌道桁建設施工)

ダイキ工業(株)

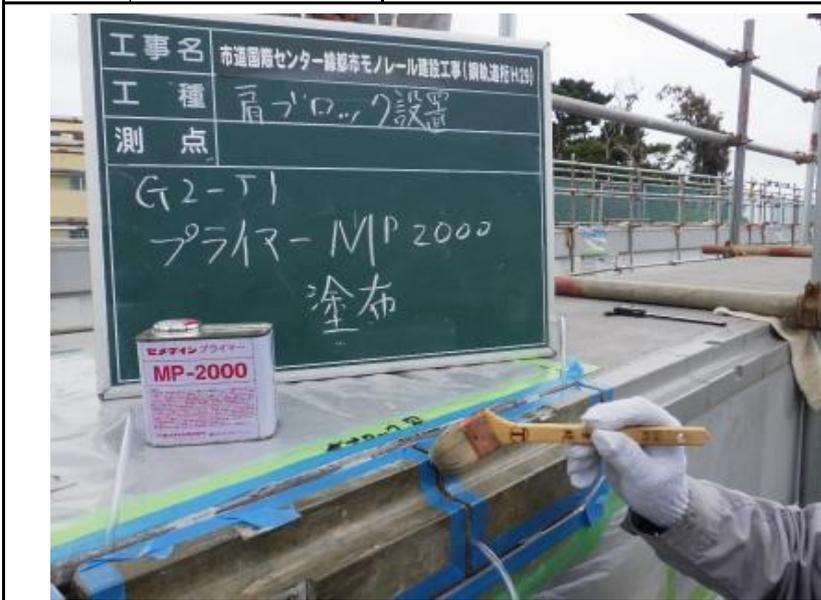

通し番号	58
備考	
P676～P680 G2-J1 MP-2000塗布 状況	

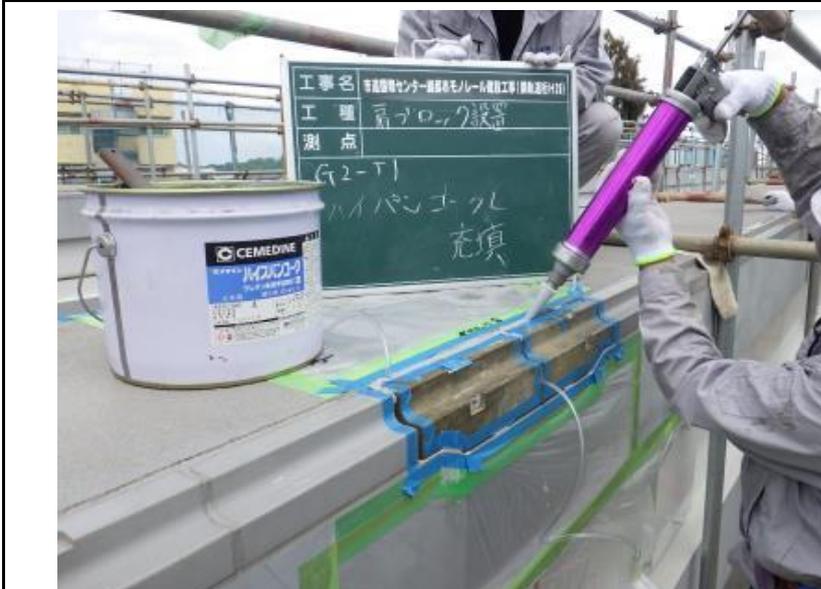

通し番号	59
備考	
P676～P680 G2-J1 ハイパンコークL充填 状況	



通し番号	60
備考	
P676～P680 G2-J1 ハイパンコークL ヘラ押さえ 状況	

市道国際センター線都市モノレール建設工事(鋼軌道桁建設施工)


ダイキ工業(株)



通し番号	61
備考	
P676～P680 G2-J1 ハイパンコークル 完了	




通し番号	62
備考	
P676～P680 G2-J1 ハイパンコークル 完了	

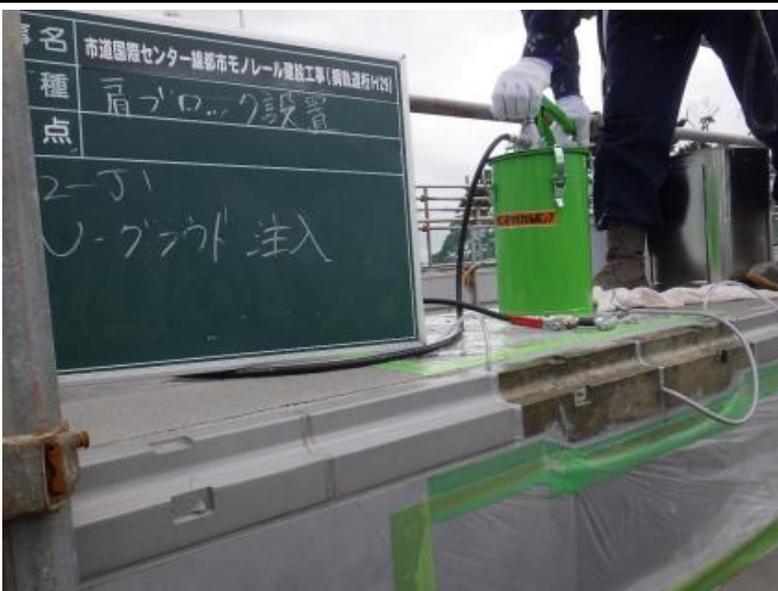

通し番号	63
備考	
P676～P680 G2-J1 Uグラウト注入 状況	


市道国際センター線都市モノレール建設工事(鋼軌道桁建設施工)

ダイキ工業(株)

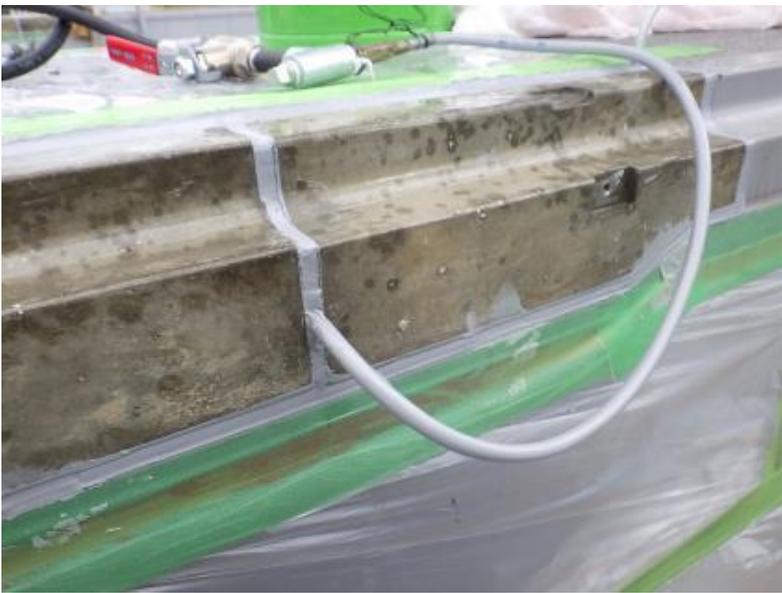
	通し番号	64
	備考	
<p>P676～P680 G2-J1 Uグラウト注入 状況</p>		
	通し番号	65
	備考	
<p>P676～P680 G2-J1 Uグラウト注入 状況</p>		
	通し番号	66
	備考	
<p>P676～P680 G2-J1 Uグラウト注入 完了</p>		

市道国際センター線都市モノレール建設工事(鋼軌道桁建設施工)

ダイキ工業株

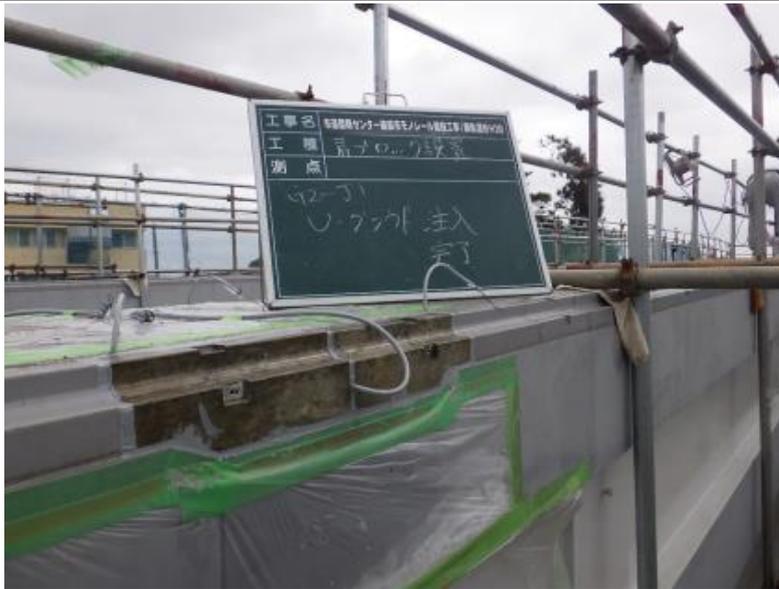

通し番号	67
備 考	
P676～P680 G2-J1 Uグラウト注入 完了	

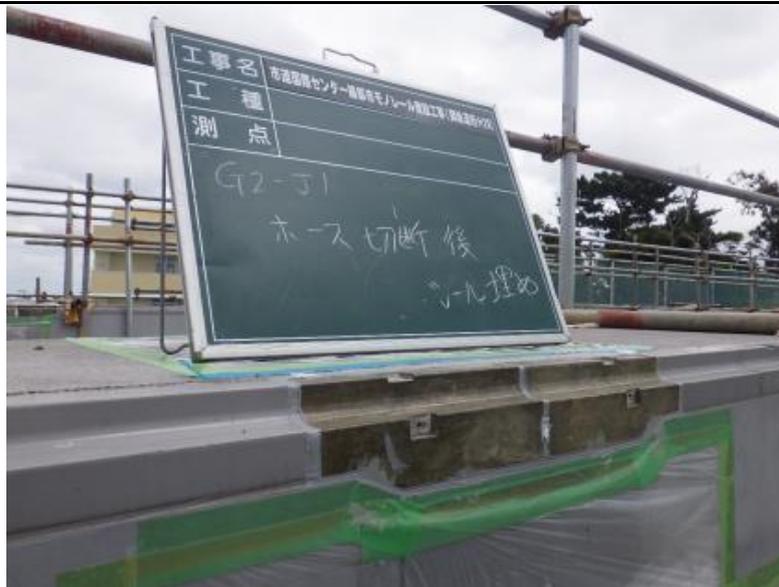


通し番号	68
備 考	
P676～P680 G2-J1 Uグラウト注入 注入口シール埋め 完了	




通し番号	69
備 考	
P676～P680 G2-J1 Uグラウト注入 注入口シール埋め 完了	

市道国際センター線都市モノレール建設工事(鋼軌道桁建設施工)

ダイキ工業(株)

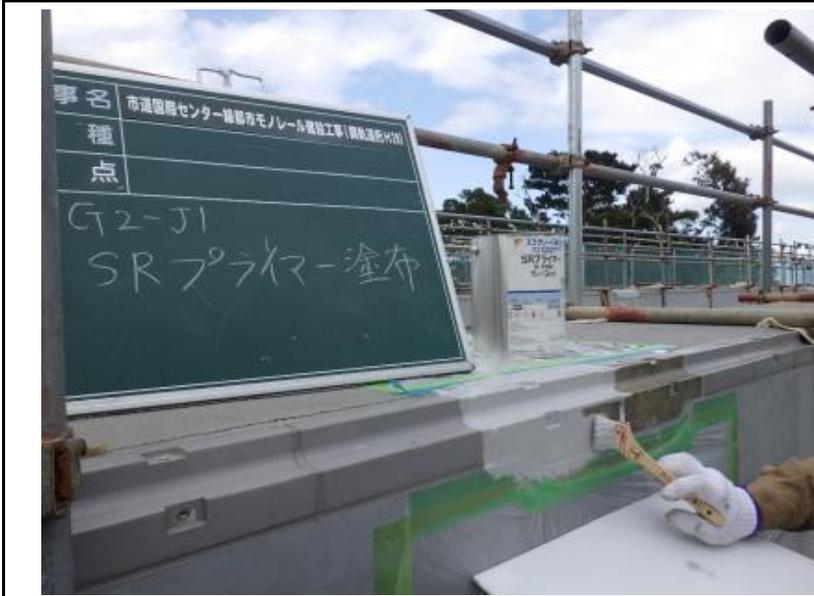

通し番号	70
備考	
P676～P680 G2-J1 状況	

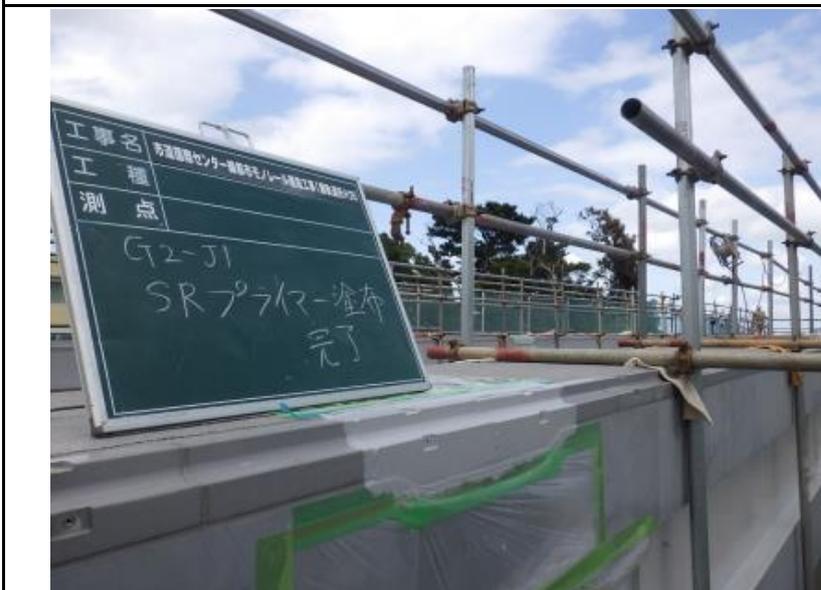


通し番号	71
備考	
P676～P680 G2-J1 SRプライマー塗布 完了	




通し番号	72
備考	
P676～P680 G2-J1 SRトップF塗布 状況	

市道国際センター線都市モノレール建設工事(鋼軌道桁建設施工)

ダイキ工業株

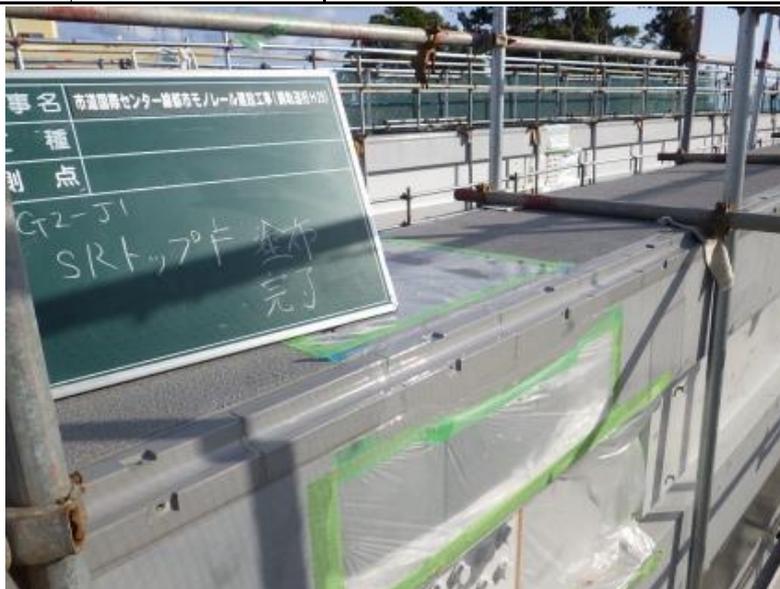

通し番号	73
備考	
P676～P680 G2-J1 SRトップF塗布 完了	

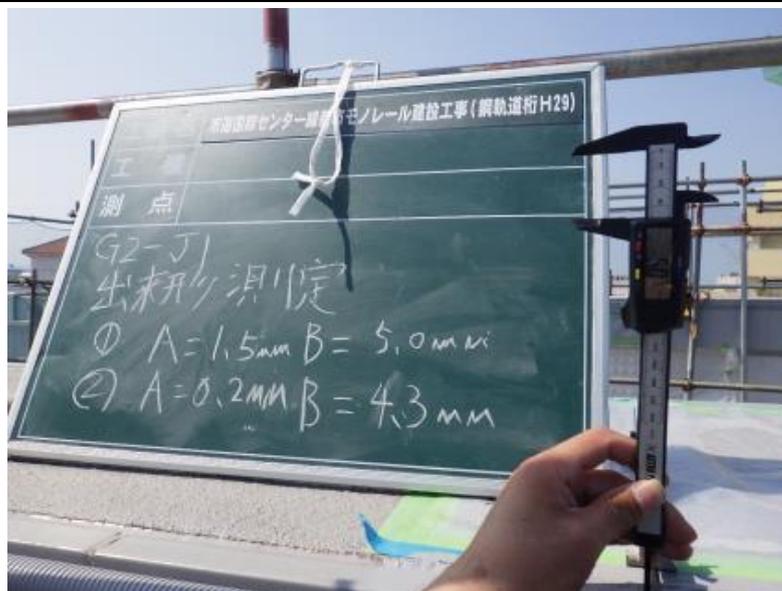


通し番号	74
備考	
P676～P680 G2-J1 出来形測定	
①	1.5 mm 5.0 mm
②	0.2 mm 4.3 mm



通し番号	75
備考	
P676～P680 G2-J1 出来形測定	
①	1.5 mm 5.0 mm
②	0.2 mm 4.3 mm

市道国際センター線都市モノレール建設工事(鋼軌道桁建設施工)

ダイキ工業(株)

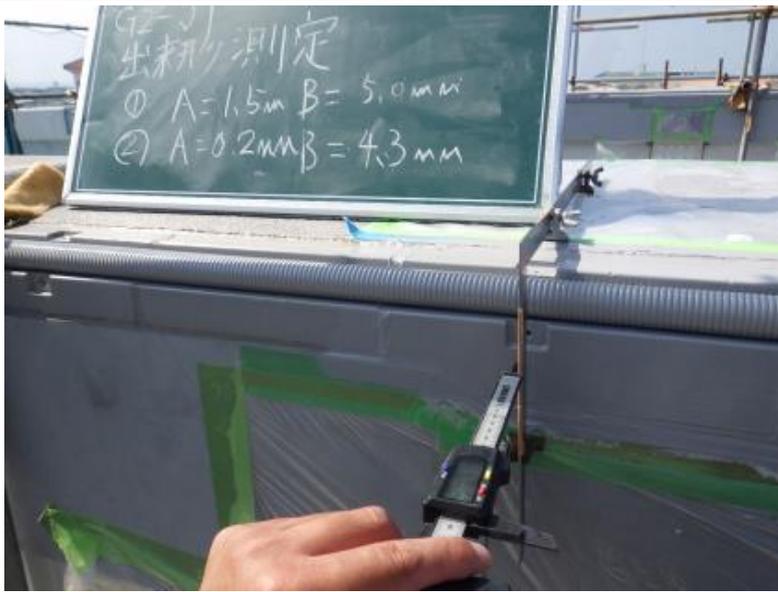

通し番号 76

備考

P676~P680

G2-J1

出来形測定

- ① 1.5 mm
5.0 mm
- ② 0.2 mm
4.3 mm



通し番号 77


備考

P676~P680

G2-J1

出来形測定

- ① 1.5 mm
5.0 mm
- ② 0.2 mm
4.3 mm

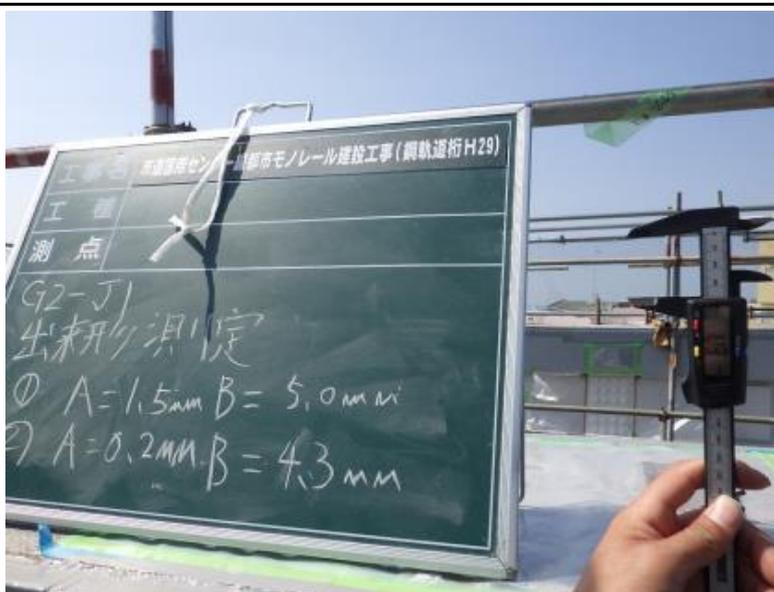

通し番号 78

備考

P676~P680

G2-J1

出来形測定

- ① 1.5 mm
5.0 mm
- ② 0.2 mm
4.3 mm

市道国際センター線都市モノレール建設工事(鋼軌道桁建設施工)

ダイキ工業株



通し番号 79

備考

P676~P680
G2-J1
出来形測定
① 1.5 mm
5.0 mm
② 0.2 mm
4.3 mm



通し番号 80

備考

P676~P680
G2-J1
出来形測定
① 1.5 mm
5.0 mm
② 0.2 mm
4.3 mm



通し番号 81

備考

P676~P680
G2-J1
完了

市道国際センター線都市モノレール建設工事(鋼軌道桁建設施工)

ダイキ工業(株)

	通し番号	82
	P676～P680 肩ブロック補修 着工前	
	通し番号	83
	備 考 P676～P680 肩ブロック補修 清掃	
	通し番号	84
	備 考 P676～P680 肩ブロック補修 シーカディア31塗布	

市道国際センター線都市モノレール建設工事(鋼軌道桁建設施工)

ダイキ工業株



通し番号 85

備考


P676~P680
肩ブロック補修
研磨紙ずり



通し番号 86

備考

P676~P680
肩ブロック補修
SRプライマー塗布

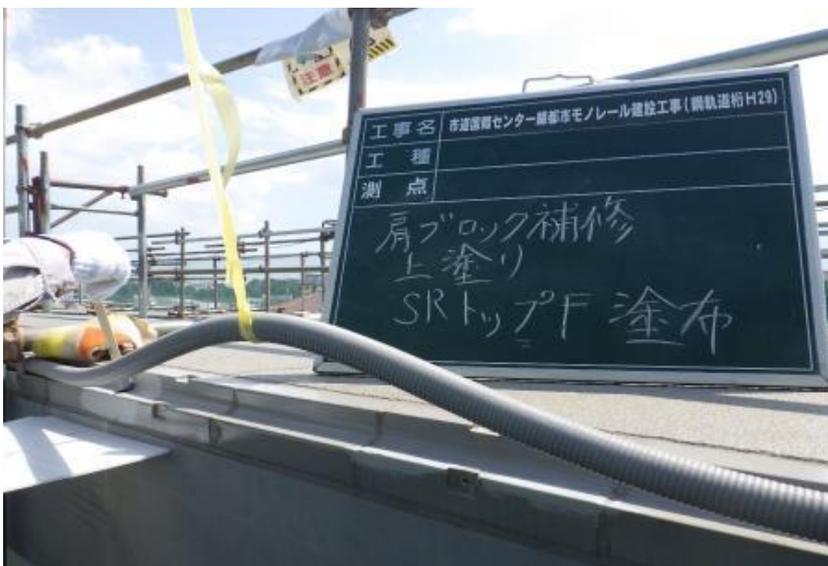

通し番号 87

備考


P676~P680
肩ブロック補修
SRトップF塗布

市道国際センター線都市モノレール建設工事(鋼軌道桁建設施工)


ダイキ工業(株)



通し番号	88
備考	
P676～P680 肩ブロック補修 完了	



通し番号	
備考	



通し番号	
備考	
